



# Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város

Városfejlesztési Iroda koordinálásával megvalósuló  
folyamatban lévő beruházások

2024. Június



**HÓDMEZŐVÁSÁRHELY**  
*Generációk jövője az Alföldön*

# Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Hódmezővásárhely város területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre

KEHOP-3.2.1-15-2017-00011

A projektet az Önkormányzat és az NFP (ÉKM) konzorciuma valósítja meg.

Támogatás összege: 685 724 006 Ft

Összköltség: 781 727 677 Ft

A projekt megvalósításának kezdete: 2017.01.16.

A projekt fizikai befejezésének határideje: **2023.12.31.**

2022. 06. 25-én a projekt keretében elkészült a hulladékudvar (3570/64 hrsz, volt állatvásártér) az AQUA-GENERAL Kft. kivitelezésével.

A hulladékudvar megnyitására az engedélyek beszerzését követően 2022. november 2-án került sor.

A szemléletformáláshoz kapcsolódó tevékenységeket a Bartha Management Kft. látta el. Nettó 20 919 257,- Ft értékben valósultak meg feladatok: ismeretterjesztő előadások, kisfilm, Tv spot, PR cikk, honlap, közösségi oldal, rendezvényekhez kapcsolt megjelenések, iskolai-óvodai előadások, ajándéktárgyak, nyomdai kiadványok.

A projekt sajtónyilvános zárórendezvénye 2023. 11. 30-án került lebonyolításra a PR és tájékoztatói feladatok ellátásáért felelős Krá-Vill Bt. közreműködésével.

Komposztáláshoz beszerzendő egyéb anyagmozgató- és rakodógépek beszerzése nem valósult meg.

A projekt pénzügyi és adminisztratív zárása, a záró beszámoló elfogadása még folyamatban van az Irányító Hatóságnál, a projekt záró helyszíni ellenőrzése már lefolytatásra került.



# Leromlott városi területek rehabilitációja Hódmezővásárhelyen

## TOP-6.7.1-16- HM1-2017-00001

A projektben 118 lakás energetikai korszerűsítése (külső hőszigetelés, nyílászáró-csere, földem hőszigetelés, hőszivattyús bojler), valamint egy közösségi ház építése valósult meg.

HMJV Közgyűlése 2021. augusztusában önerő biztosításáról döntött az 1; 3-5 részajánlatok vonatkozásában így 70 lakás felújítása kezdődhetett meg 2021. októberében.

A 2. rész közbeszerzését újra ki kellett írni, itt 2022. márciusában kezdődhettek meg a munkálatok.

Többlettámogatási igény került benyújtásra az Irányító Hatóság felé 2021. májusában, mely 2022 augusztusában került megítélésre. (357 millió Ft)


Az 1; 3, 4-es részajánlatok vonatkozásában a kivitelezés korábban befejeződött. A 2. rész (Dobó u. 34-48. Szám alatti lakások) műszaki átadás-átvételi eljárása 2023. Júniusában lezárásra került.

A közösségi ház kivitelezése is lezárult, az épületre kiadták a használatbavételi engedélyt.

A berendezési tárgyak 2023.11.30-ra leszállításra kerültek. Maradványösszegeből út, járda, parkoló, kamera, tereprendezési munkálatok és füvesítés valósult meg..

Projekt befejezési időpontja : 2023.12.31.

Projekt lezárásra és fenntartási időszakba való helyezési időpontja:  
2024.04.30

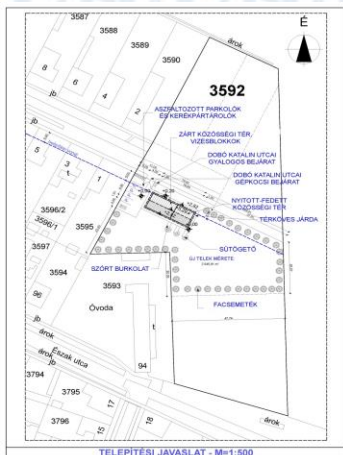

**HÓDMEZŐVÁSÁRHELY**  
*Generációk jövője az Alföldön*

# Tanyavillamosítás (I.):

•**VP6-7.2.1.4-17:** Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019-ben pályázatot nyújtott be VP6-7.2.1.4-17 kódszámú pályázatra 22 db tanya villamosítására (elektromos bekötés) vonatkozóan. A támogatás összege a 22 db tanya vonatkozásában 43.959.692 Ft volt, mely 90%-os támogatást jelentett. A kivitelezésre vonatkozó új MVM ajánlatok beérkezését követően (2022. július) a tanyatulajdonosok közül 11-en visszaléptek, ebből 7-en már megvalósították a villamosítást, a többiek pedig a megemelkedett költségek miatt nem vállalták. Ekkor újrapontozást kértünk az Irányító Hatóságtól a kilépők okán. Ennek elfogadására 2023. május 9-én került sor. A kilépők okán -az új MVM Démász Áramhálózati Kft. (a továbbiakban: MVM) ajánlatok alapján- a megítélt támogatás összege 23.944.936 Ft lett. Az MVM ajánlatok lejárása miatt (3 hónap) ismét új ajánlatokat kellett bekérnünk. Ezek beérkezését követően hárman visszalépésüket jelezték (egy fő a már megvalósított kivitelezés, 2 fő pedig a megnövekedett költségek miatt), melynek következtében a pályázat nem támogathatóvá vált.

•A pályázat megvalósíthatóságához legalább 10 tanyatulajdonos részvétele szükséges a pontozás alapján, ezért az Önkormányzat segítséget akart nyújtani azon tanyatulajdonosok számára, ahol a kiépítés költsége nagy mértékben megemelkedett, és emiatt a megnövekedett többletköltségeket a tulajdonosok nem tudják biztosítani, kilépésükkel azonban a teljes projekt megghiúsulna. A megnövekedett MVM költségek miatt kilépő tanyatulajdonosoknak az önkormányzat kamatmentes kölcsön nyújtásával próbált volna segíteni, hogy a pályázat megvalósulhasson.

•A tanyatulajdonosok közül 1 fő ezen felajánlást elutasította, így a pályázatban részt vevő tanyatulajdonosok száma végül 9 maradt. Fentiekre tekintettel a pályázat nem támogatható státuszba került. A Támogatói okirattól a Közgyűlési döntés értelmében az Önkormányzat elállt.

# Tanyavillamosítás (II.):

- **VP6-7.2.1.4-17-Sóshalmi tanyák** : Tartalom: 2 db tanyaóra villamos-áram bevezetése, 5 db tanyaóra napelemes rendszer telepítése/villamos-hálózat bővítés, régi TSZ hálózatról történő lecsatlakozás. Pályázat összköltsége: 29 242 820 Ft. Mivel többen lemondták a megnövekedett költségek okán a megvalósítást, így a pályázat újrapontoztatása vált szükségessé, mely a hatóság részére beküldésre került. A kiesők okán lecsökkent pontszám is elegendő a megvalósításhoz, így az Önkormányzat újabb árajánlatokat kért a vonatkozó költségek kapcsán. Az ajánlatok beérkeztek, az együttműködési szerződések módosítása megtörtént a megváltozott költségek okán. Az MVM felé az igénybejelentők elküldésre kerültek 2024.05.14-én.

# Interreg pályázatok:

Az INTERREG VI A Románia-Magyarország program keretén belül “Kétkeréken határok nélkül” elnevezéssel pályázat került benyújtásra.

A pályázat keretében tervezett feladatok:

- 1,2 km bicikliút kiépítése Hódmezővásárhelyről Makó irányába
  - kerékpáros túra szervezése mindkét partnervárosból, felkeresve és megtekintve az út melletti már megvalósult jó gyakorlatokat.
  - Ezen kívül konferencia szervezése valósul meg a makroregionális stratégiák kialakításához a zöld kapcsolat és zöld infrastruktúra beállításához.
- Partner Arad Város Önkormányzata, illetve a MATRTA HUB kulturális központ.

A pályázat benyújtási határideje: 2024.01.26 volt.

A pályázat megvalósítási időtartama 2024 nyarától 2025 év végéig terjed.

Költségvetés: Összesen 319.788 EUR. Hmvszám: 99.994 EUR ERFA támogatásban, 18.749 EUR állami társfinanszírozásban részesülhet melyhez 6.250 EUR önrészt kell biztosítani.

**A pályázatok elbírálásáról még nem érkezett döntés, annak várható ideje 2024. július.**

# Tóth malom utca meghosszabbítása



I. ütemben a Tóth malom utca meghosszabbítása a Kaszap utcai körforgalomig (U-2.1)

-A műszaki átadásra 2023 december 13-án került sor. Az út forgalomba helyezésének engedélye 2024.02.07-én került kiadásra.

A közvilágítás ideiglenes napelemes lámpákkal lett megoldva.



A teljes szakasz mellett kerékpárforgalmi létesítmény tervezésére lett indítva közbeszerzés, melyen belül a teljes szakaszon közvilágítás, illetve a felújítandó szakasz híd műtárgy tervezése, szükséges közműkiváltások tervei és kisajátításhoz vázrajzok fognak elkészülni. -szerződéskötés (Nyertes ajánlattevő: Innober-Wave Kft. br. 15.722.600,-Ft; határidő: 2024.07.26.)

2024



Kivitelező: Colas Zrt.

Kivitelezés költsége: 99.178.920,- Ft  
+ fordított áfa

Munkaterület átadása: 2023.03.31.

Befejezési határidő: munkaterület  
átadását követően 8 hónapon  
belül

# Városháza tornyának látogathatóvá tétele

**Kivitelező : HMSZ Zrt.**

**Vállalási ár: nettó 4.470.000,- Ft**

**Munkaterület átadása: 2024.02. 14.**

**Elkészült: 2024.03.19.**

1970 óta nem volt látogatható a torony. A toronyba felvezető úton villanszerelés, festés, mázolás, korlátok és védőlemezek felszerelése történt.

A folyosón installációk kerültek elhelyezésre a városháza történetéről és felújításáról a Tornyai János Múzeum kollégái segítségével.



**2024**



# TOP\_PLUSZ-1.3.1-21-CS1-2022-00004 "Fenntartható városfejlesztés Hódmezővásárhelyen"

-Támogatási összeg: 60 000 000 Ft.-

A Támogatási Szerződés hatályba lépett 2023.05.19-én.

2024



FVS és TVP módosítás az uniós elvárások beemelése okán --> megtörtént  
(Népszámlálási adatokkal való felülvizsgálat folyamatban)



Tanulmányok készítése:

1. Digitális légi felvételezés és lézerszkennelés: Environsense Kft. Br 22.603.460 Ft (lezárult)



2. Térinformatikai rendszer felépítése, üzemeltetése: Intermap Kft. Létesítés költsége: Br 4.603.750,- Ft. (lezárult)



3. Kerékpárforgalmi Hálózati Terv készítése Nyertes: Ex Ante Kft (Br.:3.416.300,- Ft, 5+1hónap 2023.07.05 a hatályba lépés dátuma) - A Terv elkészült



4. . Zöldinfrastruktúra Fejlesztési és Fenntartási Akcióterv (ZIFFA): Nyertes: Ex Ante Kft  
Bruttó 2.385.060 Ft, 6 hónap, 2023.11.17 a hatályba lépés dátuma) - A Terv elkészült



5. ITVT : előkészítés alatt



# TOP Plusz 1.3.2 Fenntartható városfejlesztés pályázat

2024



Belváros felújítására (Ótemplom környéke és multifunkciós tér kialakítása) vonatkozó kivitelezés beemelése a **TOP Plusz 1.3.2 felhívásba.**

Megalapozó dokumentum elkészült.



A ZIT (Zöld Infrastruktúra Tervzsűri) felé a Megalapozó dokumentum és a tervek novemberben benyújtásra kerültek. Pályázat benyújtásra került 2024.01.04-én.

**Elbírálásáról azóta nem történt értesítés.**

# Napelem telepítések (I.)

## Napelemes rendszerek telepítése a bölcsődéknél

Kivitelező: Hódszolár Kft.

A Hóvirág utcai bölcsőde esetében 13.7 kW-, az Oldalkosár utcai bölcsőde esetében 11,21 kW teljesítményű napelemrendszer került kialakításra, a vállalkozó a munkát nettó 6,5 mFt értékben nyerte el és 2023.11.02-án adta át. MVM mérőóra cseréket elvégezte, az energia termelés megkezdődött.



2024



## Napelemes rendszerek telepítése a HTKT intézményeinél

A rendszert az MVM átvette, jelenleg is folyik a termelés/visszatáplálás, a napelemeken kívül kivitelezésre került továbbá 2 klíma cseréje és további 3 kialakítása Csodaház esetében, valamint 5 új klíma telepítése Kagylóhéj esetében. A munkát Halasi Ferenc e.v. kivitelezte nettó 9.330.860,- Ft-értékben.



## Napelemes rendszerek az óvodáknál:

Szerződés hatályba lépett minden intézmény esetében, a hálózati csatlakozási tervek elfogadásra kerültek, a Jenzen Solar által nyert 3 óvoda helyszínén és az Ökohód Kft részéről elnyert 9 helyszínen is a bekötés és mérőóra csere már megtörtént. Teljesítés az Ökohód esetében 2024.04.17. , Jenzen Solar esetében 2024.05.22. volt. Folyik a termelés/visszatáplálás.

Kivitelezés költsége: nettó 16.591.186 Ft (Ökohód Kft. és Jenzen Solar Kft.)



# Napelem telepítések (II.)



2024

## **BFMK és Tornyai János Múzeum:**

A szerződések hatályba léptek, mindkét intézménynél az Ökohód Kft nyerte a beszerzési eljárást. Tornyai János Múzeum vonatkozásában a kivitelezés már megtörtént, itt az MVM által elvégzendő mérőóra cseréjére várunk.

BFMK esetében a kivitelezés befejeződött. Az MVM által elvégzendő mérőóra cseréjére várunk.

Kivitelezés költsége Nettó 3.263.200,- Ft (TJM) + nettó 7.500.000,- Ft (BFMK)

## **Városháza energiahatékonyság javítását szolgáló fejlesztések (napelemes rendszerek telepítése):**

Napelemes rendszer kiépítése van tervezve a Városházára. Az épület műemléki jellege miatt különös körüljárással kell megtervezni. Első körben egy statikai szakvéleményt készítettünk, ezt követően pedig műszaki leírást az Örökségvédelmi Tervtanács véleményezéséhez. A tervtanács további terveket kért tőlünk, így jelenleg annak beszerzése folyik. A szükséges engedély/hozzájárulások beszerzését követően kivitelezésre közbeszerzési eljárás kerül kiírásra. A rendszer összteljesítménye a kérhető maximum, 50 kW.



# Egyéb felújítások, karbantartások



2024

## - Okos zebrák telepítése (2 db)

Teljesítés helyei: Kaszap u. 10. és Holló u. 21.

Kivitelező: Pearl Enterprises Kft.

Kivitelezés költsége: nettó 6.862.379,- Ft + 27% ÁFA (bruttó 8.715.222,- Ft)

Teljesítés időpontja: 2024. április 22.



HÓDMEZŐVÁSÁRHELY  
*Generációk jövője az Alföldön*

# Közvilágítás korszerűsítése



2024




Árubeszerzés: közbeszerzési eljárás került indításra 2024 februárjában mely a közvilágítási célú világítótestek korszerűbb, energiahatékony típusvariánsokra való cseréjét célozza meg a város meghatározott területein.

A nyertes ajánlattevőtől, a Schröder Mo. Zrt-től kerültek a lámpatestek , beszerzésre.

Közvilágítás korszerűsítés: beszerzett lámpatestek felszerelésére Délvill Kft. nyerte el a közbeszerzési eljárást.

A lámpák felszerelése megtörtént.

Műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdődött.

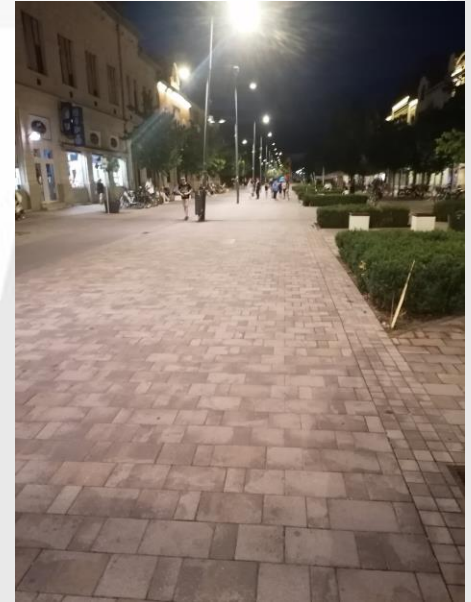

# Kossuth téri kávézó építése

Kossuth téri kávézó építése befejeződött



2024



Az épületnek kettős funkciója lesz.

Egyrészt szolgáltatásként KÁVÉZÓként,  
másrészt nyilvános illemhelyként fog üzemelni.

Nyertes Vállalkozó az Épker Expert Építőipari és  
Élelmiszer Kereskedelmi Kft.

Vállalkozói díj: bruttó 48.521.722,- Ft.



HÓDMEZŐVÁSÁRHELY  
*Generációk jövője az Alföldön*

# Városháza pincéjében zenekari kamaraterem kialakítása:

**Teljes belső felújítás, bejárat és lépcső felújítása, akadálymentesítés, új villamos hálózat , elektromos fűtés kiépítése, vizesblokkok felújítása**

Nyertes kivitelező: Miksi Bau Kft-mindkét ütemre  
Felújítási összeg: nettó 84.094.266,- Ft (2 ütemé)  
Szerződéskötés időpontja: 2024.04.02  
Kivitelezés 50%-os készülnél tart.

**2024**



**HÓDMEZŐVÁSÁRHELY**  
*Generációk jövője az Alföldön*

# Óvodafelújítások 2024


1. Malom utcai Óvoda - Nyertes Vállalkozó - Ferroép Zrt. - bruttó 6 307 333,-Ft  
(Parkoló kialakítása, fűtés korszerűsítése, kerítés javítása, csapadékvíz elvezetése)
2. Klauzál utcai Óvoda - Nyertes Vállalkozó - Ferroép Zrt. - bruttó 876 823,-Ft  
(Raktár felújítása, belső burkolat készítése, áramhálózat kialakítása, festési munkálat)
3. Szabadság téri Óvoda - Nyertes Vállalkozó - Ferroép Zrt. - bruttó 561 059,-Ft  
(Külső homlokzati burkolat mázolás, ereszcatorna javítása)
4. Szent István utcai Óvoda - Nyertes Vállalkozó - Ferroép Zrt. - bruttó 824 401,-Ft  
(Balesetveszélyes téglakerítés, bontása, újjáépítése és betonozása, vakolása)
5. Oldalkosár u 4. Óvoda - Nyertes Vállalkozó - Ferroép Zrt. - bruttó 468 884,-Ft  
(Kerékpártároló előtető építése, csapadékvíz elvezetése, kerti játéktároló építése, térburkolattal)
6. Oldalkosár u 14. Óvoda - Nyertes Vállalkozó - Marsala Kft. - bruttó 5 368 609,-Ft  
(Álmennyezet építése folyosó szakaszon, fűtés korszerűsítése)
7. Pálffy Óvoda - Nyertes Vállalkozó - Ferroép Zrt. - bruttó 2 137 701,-Ft  
(belső udvar térburkolat kiépítése, játszótéri gumiburkolattal, csapadékvíz elvezetése)

Szerződéskötések megtörténtek. A munkálatok az óvodai szünetekben valósulnak meg.

2024



# Óvodafelújítások 2024

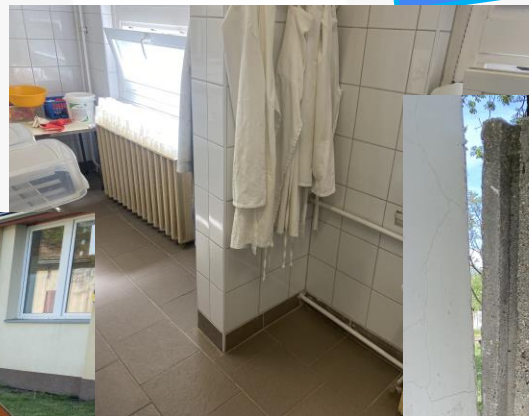

**HÓDMEZŐVÁSÁRHELY**  
*Generációk jövője az Alföldön*

# Hóvirág bölcsőde megsüllyedt tartószerkezetének újjáépítése

Nyertes: Miksi Bau Kft

Vállalási ár: bruttó 3.628.118,- Ft

Teljesítési határidő: 60 nap (munkaterület adástól)

Munkaterület adás: 2024.05.29

2024



# Kőfal világítás

2024



- **Kőfal világítás kivitelezésére közbeszerzési eljárás indítása van folyamatban.**

**Terv elkészült. Tartalom:** A „Kőfal” (Szőnyi utca – Dr. Imre József utca között szakaszának) megvilágítása/díszvilágítása készülne el, a kőfal elé a talajba süllyesztett világítótestekkel. A megfelelő mechanikai és rongálás elleni védelem érdekében a lámpák süllyesztett keretbe, lépésálló üvegezéssel kerülnek elhelyezésre. Az egyedileg vezérelhető energiatakarékos RGB LED fényforrások, a fényforrások színének változtathatóságával tervezettek.



**HÓDMEZŐVÁSÁRHELY**  
*Generációk jövője az Alföldön*

# Napelemes közvilágítás

2024



- Tóth malom utcai és a kutyafuttatóhoz telepített lámpák után újabb közbeszerzési eljárás került kiírásra napelemes lámpák telepítésére. Az eljárás folyamatban van.
- 11 millió forintos keretösszeg terhére év végéig van lehetőség napelemes lámpák rendelésére és telepítésére.
- Első körben az alábbi helyekre van tervezve telepítés: Halesz, sor, Gorzsa , Z-bérház , Kutyafuttatóhoz, Tárkány-Szücs Ernő tér , Sarkaly, Tóalj utcai park



# 2024-es felújítások tervezési feladatainak indítása

2024



Városháza homlokzatfelújítása (tervkészítés-Ny-D-K oldal)

A Városháza épületének utcai homlokzatai közül az északi homlokzat a toronnyal együtt már elkészült, így a további ütemekre a terveket a nyugati, déli és keleti homlokzatra kell elkészíteni, igazodva a már elkészült északi homlokzathoz.




# 2024-es felújítások tervezési feladatainak indítása



## Parkolóház kiviteli tervkészítése

Belváros rendezésének IV. ütemeként a Sarokház épület és az Ótemplom védfala mögött két szintes parkolóházat terveztünk 2022-ben a hozzá tartozó keleti területi egység zöldterületi korszerűsítésével. Ez évben a parkolóház kiviteli terveit készítjük el közbeszerzési eljárás keretében és indítjuk a pályázatát a TOP plusz 1.3.2-23 Fenntartható városfejlesztés projektben.

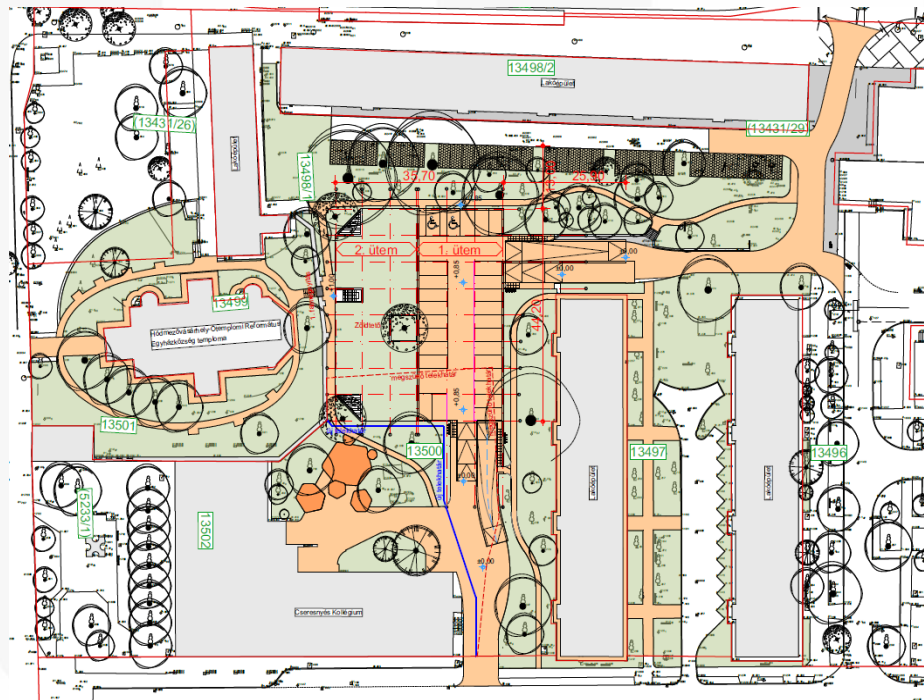

# TOP Plusz előkészítési feladatok

## Zrínyi 9. sz. alatti épület felújítása orvosi rendelők kialakításához


Állapotismertető szakvélemény és fejlesztési javaslat készült (Bautender Ziegel Kft. bruttó 1.905.000 Ft, elkészült 2024. március 19-én).



A szakvélemény alapján az ingatlan felújítás és energetikai felújítás tervezésre nyílt közbeszerzési eljárás került lefolytatásra, melynek nyertese a VASSCOGENPLAN Kft. lett (bruttó 8.607.777 Ft, tervszállítási határidő: 2024.11.28.).



2024

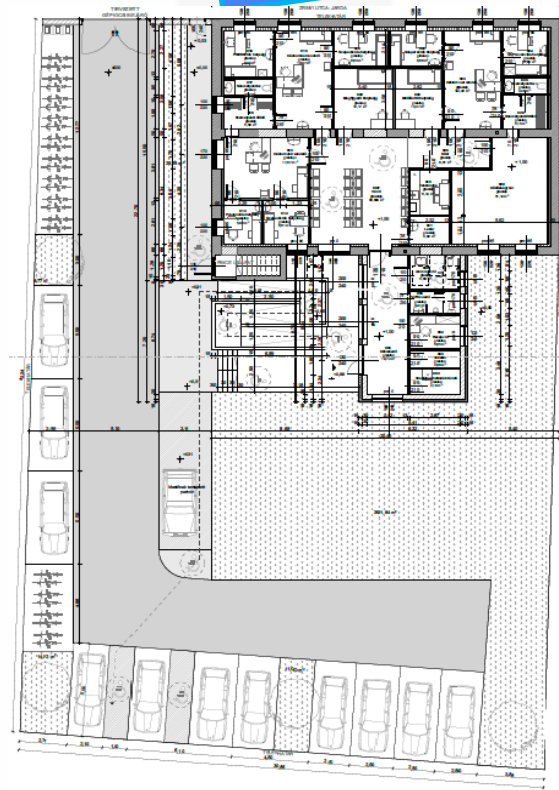

# TOP Plusz előkészítési feladatok

## Városi könyvtár energetikai tervezése

Energetikai audit elkészült mind a két épületre.

Tervező beszerzésére közbeszerzési eljárás került kiírásra, mely az ajánlatkérési szakaszban tart.

2024



# Hódmezővásárhelyi foglalkoztatási együttműködések kialakítása

## TOP-6.8.2-15-HM1-2016-00001

- Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata, konzorciumban a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatallal összesen **920,35 millió Ft vissza nem térítendő európai uniós támogatást** nyert el, melynek jelentős részét a Kormányhivatal használta fel.
- Fő cél: a térség fejlődését szolgáló **munkaerő-piaci, képzési és foglalkoztatási programok teljesítése** (2023. novemberig 712 fő került bevonásra a projektbe).
- A projekt megvalósításra került, zárórendezvénye 2023. 11. 14-én került megtartásra (projekt fizikai befejezése: 2023. 11. 30.).
- **2024-ben a Támogató felé történő teljes elszámolása megtörtént**, a projekt záró helyszíni ellenőrzése is lefolytatásra került, a záró szakmai beszámolót elfogadták => **Fenntartásban lévő projekt**



# A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex programok Hódmezővásárhelyen - TOP-6.9.1-16-HM1-2017-00001

- A TOP-6.7.1-es infrastrukturális beavatkozásokat (Dobó – Bibó - Janáky utcai önkormányzati lakások felújítása, új közösségi tér létesítése az Észak utcai óvoda mellett) egészíti ki egy – **a társadalmi hátrányok kompenzálását célzó, komplex** (szociális, oktatási, foglalkoztatási, egészségügyi, közösségfejlesztési) - **programcsomag**.

Cél: a leszakadással veszélyeztetett városrészekben élők életlehetőségeinek javítása; integrációjuk, felzárkózásuk elősegítése.

Megvalósítók: Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata és konzorciumi partnere (HTKT Kapcsolat Központ)

Összköltség: 145 486 762 Ft (100%-os támogatási intenzitás)

A projekt időtartama: 2018.02.01-től 2023.12.31-ig.

Legalább 2024.06.30-ig saját forrás terhére közösségi programokat és szociális munkát szükséges biztosítani.



# "4414 számú közút fejlesztése" - TOP\_Plusz-6.2.1-23 „Fenntartható versenyképes városfejlesztés” felhívásra benyújtandó pályázat előkészítése

A 4414 jelű Hódmezővásárhely-Maroslele-Makó összekötő út 0+749 – 7+236 km szelvények közötti szakasz burkolatának felújítása tervezett a támogatási keretösszegeből 1.708.226.001 Ft felhasználásáig, mely a Felhívás 2.1.1. III. 1) a) pontjának megfelelően az önállóan támogatható tevékenységek közé tartozik. A tervezett fejlesztés nem tartozik az engedélyköteles tevékenységek közé.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata felkérte a Magyar Közút Nonprofit Zrt-t a konzorciumi együttműködés megvalósítására, valamint a pályázat benyújtásához szükséges, Építési és Közlekedési Minisztérium (a továbbiakban: ÉKM) részéről kiállítandó feladatelrendelő levél bekérésére. Jelenleg a Minisztérium választ várjuk.

A válaszban foglaltak szerint tudjuk a Támogatási kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok elkészítését megkezdeni.



Köszönöm  
a  
megtisztelő  
figyelmet!
